

当初の建替工程において、令和5年度の実施設計は校舎及び屋内運動場1のみを実施する予定だったが、令和5年2月に行われた業者選定プロポーザルの際、屋内運動場3及びプールを校舎及び屋内運動場1と一体的に整備する計画の提案があり、当該提案を採用し進めることとなったため、屋内運動場3及びプールの実施設計等に必要予算を増額するもの。

1 経過

- 令和4年8月策定の北上中学校建替基本計画に基づき、令和4年9月補正予算計上（6号・繰越）
- 令和5年2月プロポーザルにより業者決定し、当該業者令和5年3月に設計業務委託契約締結
（受託者：高橋設計・久米設計特定業務委託共同企業体 契約金額：191,400千円 内容：全体の基本設計及び校舎・屋内運動場1の実施設計）

2 所要額

実施設計業務委託料（屋内運動場3及びプール分等）	36,220,800円	(財源内訳)
用地測量業務委託	3,696,000円	地方債 35,900千円
構造・省工ネ適合性判定手数料	780,500円	一般財源 4,798千円
合計	40,696,700円	

3 事業スケジュール


(1) 変更後(提案のあった建替工程)

施設名	R5年度(2023年度)		R6年度(2024年度)		R7年度(2025年度)		R8年度(2026年度)		R9年度(2027年度)		R10年度(2028年度)	
	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後
校舎												
屋内運動場1	基本・実施設計		公告 入札	建設工事				校舎・屋内運動場1 供用開始	解体工事の状況や鉄骨納期の状況により、 解体中に工事発注			
屋内運動場2	基本設計				実施設計	公告 入札			建設工事			
屋内運動場3 プール	基本・実施設計		公告 入札	建設工事				屋内運動場3・プール 供用開始				全面供用開始
現校舎			R6年2月									
現体育館					解体設計	公告 入札	解体					
現武道場					解体設計	公告 入札	解体					
現プール					解体設計	公告 入札	解体					
グラウンド									復旧・整備			
外構												駐車場等

(2) 変更前(基本計画建替工程)

施設名	R5年度(2023年度)		R6年度(2024年度)		R7年度(2025年度)		R8年度(2026年度)		R9年度(2027年度)		R10年度(2028年度)	
	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後
校舎												
屋内運動場1	基本・実施設計		建設工事				校舎・屋内運動場1 供用開始					
屋内運動場2												
屋内運動場3 プール							基本・実施設計	公告 入札	建設工事			プール 供用開始
現校舎												
現体育館							解体					
現武道場												
現プール												解体
グラウンド									復旧・整備			
外構												駐車場等

鳥瞰イメージ

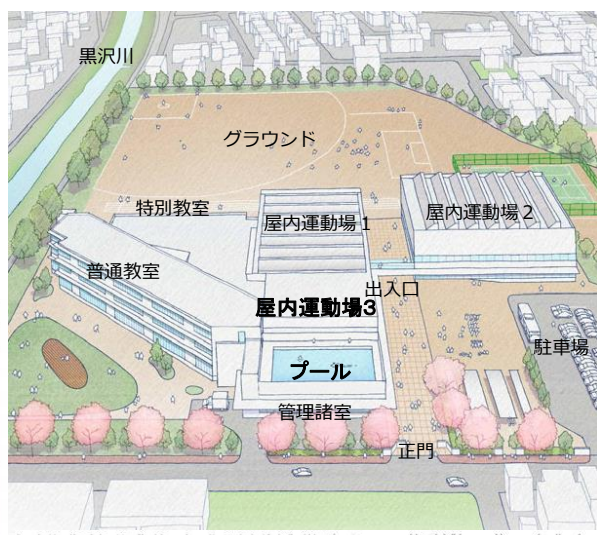

基本計画の配置(案)

