

北上中学校建替基本計画（概要）について

令和4年8月18日開催、北上市議会全員協議会説明資料


1 策定のねらい

学校運営を継続しながら、現行の北上中学校敷地内での建替え工事となることから、学校運営に支障を与えない最適なプランを検討し、北上中学校建替基本計画を策定する。

2 検討経過

- R4年2～7月 事業者との定例打合せ
- 5月 建替プラン(3案)の提案→庁内検討
 - 仮設校舎は想定しない
 - 新校舎・体育館1はR8年4月供用開始を目指す
 - 体育館は部活動が校内で実施できる規模とするため2棟建設
- 7月 修正案の提案→庁内検討
 - 修正案の確認

3 建設計画エリア

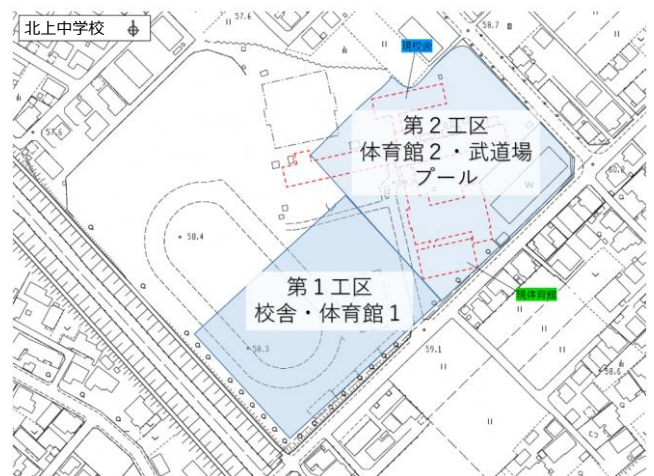

【留意事項】
本資料は令和4年8月18日時点の検討資料であり、プロポーザルの際の確定情報ではありません（担当：教育部総務課）

4 建替計画

以下の内容により、学校運営に支障を来たさない建設が可能と判断

- 【第1工区】①「校舎・体育館1」を建設(R6～7)→新校舎供用開始(R8)
- 【第2工区】② 現校舎解体(R8)
- ③「体育館2・武道場・プール」建設(R9)
- ④ 現体育館・現武道場・現プール解体(R10上半期)
- ⑤「外構・駐車場」整備(R10下半期)

施設名	R5		R6		R7		R8		R9		R10	
	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後
校舎	設計		建設工事					供用開始				
体育館1			建設工事					供用開始				
体育館2							設計		建設工事			
武道場									建設工事			供用開始
プール									建設工事			供用開始
現校舎							解体					
現体育館											解体	
現武道場											解体	
現プール											解体	
グラウンド							復旧・整備					
外構						通路						駐車場等

5 想定する建設規模及び概算工事費

- ① 校舎【6,700㎡】
- ② 体育館2棟【各1,600㎡】
- ③ 武道場【550㎡】
- ④ その他施設(25mプール、外構等)
- ⑤ その他工事(解体、造成)

総工事費
約66億円(税込)

6 今後のスケジュール

- R4年8月18日 市議会全員協議会
- 8月中旬 情報提供(北上中学校区、東陵中学校区)
- 9月議会 プロポーザル(基本設計及び校舎・体育館1実施設計)関係の補正予算上程
